



Interreg
España - Portugal



UNIÃO EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA


Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



Seminario para Proyectos POCTEP 4ª y 5ª convocatorias


Seminario Online 12/07/2021

PROGRAMA INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



Modificaciones al proyecto

Rui Domingues, SC POCTEP

Consideraciones Generales



- ✓ Ejecución del proyecto conforme al **Acuerdo AG-BP y Formulario de Candidatura (FdC)**.
- ✓ El Proyecto se podrá modificar, en **casos extraordinarios**, debidamente justificados y de forma limitada.
- ✓ **Planificación y Coordinación** del BP con el resto de beneficiarios.

Modificaciones al proyecto

- ✓ Se podrán presentar un **máximo de 2 modificaciones** durante toda la vida del proyecto.

- ✓ Sustancial + Sustancial
- ✓ **No Sustancial** + Sustancial
- ✓ Sustancial + **No Sustancial**
- ✓ **No Sustancial** + **No Sustancial**

Modificación Sustancial

- **Aprueba:** Comité de Gestión a propuesta de la Autoridad de Gestión.
- Podría dar lugar a la firma de una **Adenda al Acuerdo AG-BP**

Modificación No Sustancial

- **Aprueba:** Autoridad de Gestión
- En **ningún caso** supondrá nueva **Adenda al Acuerdo AG-BP**

Modificaciones al proyecto



- ✓ Presentada con al menos con **6 meses** de antelación respecto a la fecha de finalización aprobada.
- ✓ La fecha de **inicio de la elegibilidad** de los gastos es la fecha de presentación de la solicitud.
- ✓ La **diferencia** entre el primer presupuesto de la operación (total de cada Actividad, cada Categoría de Gasto y cada Anualidad) con respecto al presentado en la última modificación no puede superar el 50%.

ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	VIGENTE	SOLICITADO	VARIACIÓN
Actividad 0 - Gastos de preparación	- €	- €	- €
Actividad 1	98.428,51 €	100.879,92 €	2.451,41 €
Actividad 2	53.337,63 €	50.879,39 €	- 2.458,24 €
Actividad 3	- €	- €	- €
Actividad 4	- €	- €	- €
Actividad 5 - Gestión y Coordinación	4.928,50 €	4.928,50 €	- €
Actividad 6 - Comunicación	10.630,31 €	10.637,14 €	6,83 €
TOTAL	167.324,95 €	167.324,95 €	0,00 €

CATEGORÍAS DE GASTO			
CATEGORÍA DE GASTO	VIGENTE	SOLICITADO	VARIACIÓN
1 - Gastos de personal	28.499,95 €	31.405,76 €	2.905,81 €
2 - Gastos de oficina y admin	4.274,99 €	4.710,86 €	435,87 €
3 - Gastos de viaje y alojamiento	2.150,00 €	2.156,84 €	6,84 €
4 - Gastos por servicios y expertos	87.400,00 €	87.400,00 €	- €
5 - Gastos de equipamiento	45.000,00 €	41.651,49 €	- 3.348,51 €
TOTAL	167.324,94 €	167.324,95 €	0,01 €

ANUALIDADES			
ANUALIDAD	VIGENTE	SOLICITADO	VARIACIÓN
1	- €	- €	- €
2	- €	- €	- €
3	- €	- €	- €
4	77.332,30 €	53.151,65 €	- 24.180,65 €
5	80.806,38 €	102.535,63 €	21.729,25 €
6	9.186,27 €	11.637,67 €	2.451,40 €
TOTAL	167.324,95 €	167.324,95 €	- €

Coste elegible total del beneficiario/Umbrales financieros	
Coste elegible total	167.324,95 €
15% del coste elegible	25.098,74 €
30% del coste elegible	50.197,49 €
50% del coste elegible	83.662,48 €

ACTIVIDADES					
ACTIVIDAD	PRIMER PPTO	Mod ultima VIGENTE	SOLICITADO	VARIACIÓN	VARIACIÓN TOTAL
Actividad 0 - Gastos de preparación	- €	- €	- €	- €	- €
Actividad 1	98.428,51 €	100.879,92 €	100.879,92 €	0,00 €	2.451,41 €
Actividad 2	53.337,63 €	50.879,39 €	50.879,39 €	- €	2.458,24 €
Actividad 3	- €	- €	- €	- €	- €
Actividad 4	- €	- €	- €	- €	- €
Actividad 5 - Gestión y Coordinación	4.928,50 €	4.928,51 €	4.928,51 €	- €	0,01 €
Actividad 6 - Comunicación	10.630,31 €	10.637,12 €	10.637,12 €	- €	6,81 €
TOTAL	167.324,95 €	167.324,95 €	167.324,95 €	0,00 €	0,00 €

CATEGORÍAS DE GASTO					
CATEGORÍA DE GASTO	PRIMER PPTO	Mod ultima VIGENTE	SOLICITADO	VARIACIÓN	VARIACIÓN TOTAL
1 - Gastos de personal	28.499,96 €	31.405,77 €	23.339,53 €	- 8.066,24 €	- 5.160,43 €
2 - Gastos de oficina y admin	4.274,99 €	4.710,87 €	3.500,93 €	- 1.209,94 €	- 774,06 €
3 - Gastos de viaje y alojamiento	2.150,00 €	2.156,82 €	2.156,82 €	- €	6,82 €
4 - Gastos por servicios y expertos	87.400,00 €	87.400,00 €	96.676,18 €	9.276,18 €	9.276,18 €
5 - Gastos de equipamiento	45.000,00 €	41.651,49 €	41.651,49 €	- €	- 3.348,51 €
TOTAL	167.324,95 €	167.324,95 €	167.324,95 €	0,00 €	0,00 €

ANUALIDADES					
ANUALIDAD	PRIMER PPTO	Mod ultima VIGENTE	SOLICITADO	VARIACIÓN	VARIACIÓN TOTAL
1	- €	- €	- €	- €	- €
2	- €	- €	- €	- €	- €
3	- €	- €	- €	- €	- €
4	77.332,30 €	53.151,65 €	53.151,65 €	- €	- 24.180,65 €
5	80.806,38 €	21.553,35 €	21.553,35 €	- €	- 59.253,03 €
6	9.186,27 €	92.619,94 €	92.619,95 €	0,01 €	83.433,68 €
TOTAL	167.324,95 €	167.324,94 €	167.324,95 €	0,01 €	- €

Coste elegible total del beneficiario/ Umbrales financieros	
Coste elegible total	167.324,95 €
15% del coste elegible	25.098,74 €
30% del coste elegible	50.197,49 €
50% del coste elegible	83.662,48 €




- ✓ **Alto porcentaje de modificaciones que requieren subsanación** (histórico de las convocatorias)
 - ✓ No se explican convenientemente los cambios solicitados
 - ✓ *“Es necesario reforzar la Actividad 1 con cargo a la Actividad 2”;*
 - ✓ *“Disminuye el concepto de Personal para reforzar los SEE...”;*
 - ✓ *“Es necesario centrar los esfuerzos del personal de la Entidad en la Actividad 4...”*
 - ✓ *“Se cambian los equipamientos de acuerdo a la necesidad del proyecto...”;*
 - ✓ *La modificación presentada es la mejor propuesta para seguir ejecutando el proyecto...”.*
 - ✓ (...)

Modificaciones: Errores frecuentes

- ✓ Incoherencias entre el presupuesto solicitado en la modificación y la ejecución presupuestaria en Coopera 2020;

Gasto en circuito validación	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1 - Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	5.197,94	51.262,93	36.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92.798,04
2 - Gastos de oficina y administrativos	0,00	0,00	0,00	779,69	7.689,44	5.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,71
3 - Gastos de viaje y alojamientos	0,00	0,00	0,00	1.539,40	4.031,26	468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,82
4 - Gastos por servicios y expertos externos	0,00	0,00	0,00	948,35	3.387,38	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,98
5 - Gastos de equipamiento	0,00	0,00	0,00	98,03	3.782,35	614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,14
TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.563,41	70.153,36	43.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121.719,69

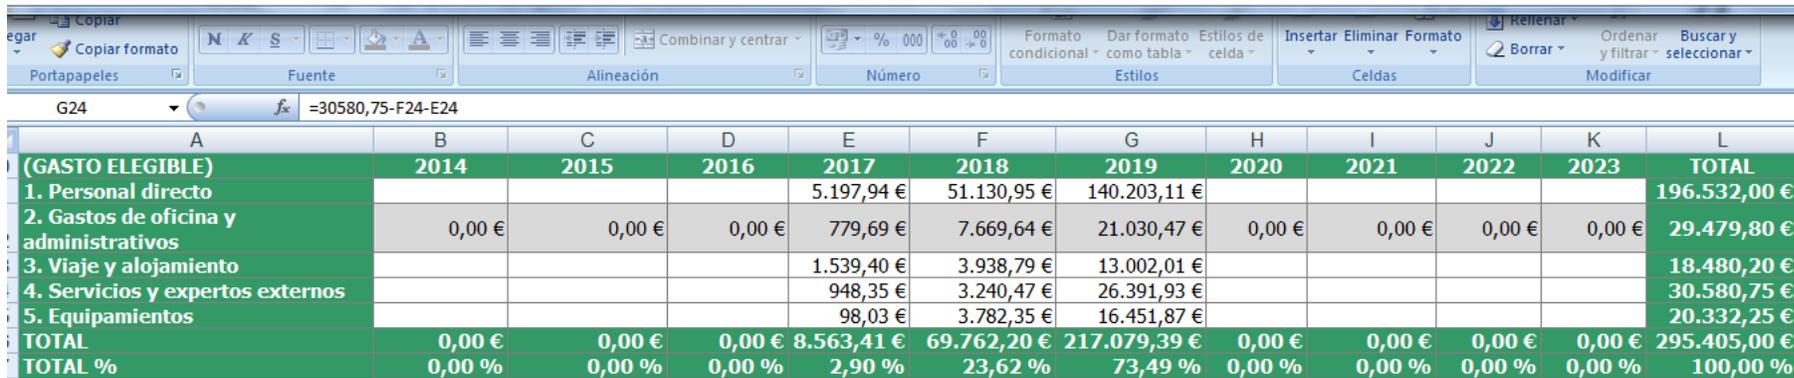

(GASTO ELEGIBLE)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1. Personal directo				5.197,94 €	51.130,95 €	140.203,11 €					196.532,00 €
2. Gastos de oficina y administrativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	779,69 €	7.669,64 €	21.030,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.479,80 €
3. Viaje y alojamiento				1.539,40 €	3.938,79 €	13.002,01 €					18.480,20 €
4. Servicios y expertos externos				948,35 €	3.240,47 €	26.391,93 €					30.580,75 €
5. Equipamientos				98,03 €	3.782,35 €	16.451,87 €					20.332,25 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.563,41 €	69.762,20 €	217.079,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295.405,00 €
TOTAL %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,90 %	23,62 %	73,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Modificaciones: Errores frecuentes

- ✓ Es imprescindible que se expliquen **los motivos concretos** que están por detrás de los cambios solicitados.
 - ✓ *¿Por qué se incrementa la Actividad 1?;*
 - ✓ *¿Por qué es necesario incrementar los SEE con cargo a Personal?;*
 - ✓ *¿Por qué es necesario cambiar los equipamientos?*
 - ✓ (...)

- ✓ **Comparar los formularios** (FdC y FF) vigente vs solicitado, aportando de forma detallada y beneficiario los motivos y justificaciones para los cambios solicitados.



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



¡Gracias! Obrigado!

poctep.eu
